

**Информация о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
направленных в 2025 году на выполнение работ по благоустройству
территорий на объекте: «Капитальный ремонт (с целью
благоустройства) площади «Крымской весны» и прилегающей
территории в городе Щёлкино Ленинского района Республики Крым» в
рамках реализации национального проекта
«Инфраструктура для жизни»**

В соответствии с пунктом 1.18 Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2025 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 19.12.2024 № 58-7/24, пунктом 1.2 Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2026 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 18.12.2025 № 58-4/25, Счетной палатой Республики Крым проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2025 году на выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Капитальный ремонт (с целью благоустройства) площади «Крымской весны» и прилегающей территории в городе Щёлкино Ленинского района Республики Крым» в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» (далее – контрольное мероприятие).

Объект контрольного мероприятия: Администрация города Щёлкино Ленинского района Республики Крым (далее – Администрация г. Щёлкино).

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Объект «Капитальный ремонт (с целью благоустройства) площади «Крымской весны» и прилегающей территории в городе Щёлкино Ленинского района Республики Крым» (далее – Объект «Капитальный ремонт (с целью благоустройства) площади «Крымской весны» и прилегающей территории в городе Щёлкино) включен в Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, источником финансового обеспечения которого являются средства бюджета города Москвы, в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым», утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 30.01.2018 № 35 (далее – ГП «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым», Порядок предоставления и распределения субсидии соответственно) – 2025 год реализации и в Адресный перечень общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Щёлкино Ленинского района Республики Крым» утверждена постановлением Администрации г. Щёлкино от 11.02.2025 № 86 (далее – муниципальная программа по формированию современной городской среды).

По общественной территории площадь «Крымской весны» и прилегающей территории в г. Щёлкино инвентаризация не проводилась,

паспорт благоустройства общественной территории не составлялся, чем не соблюден п. 2.10 Порядком инвентаризации территорий.

В бюджете муниципального образования городское поселение Щёлкино Ленинского района Республики Крым на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы по формированию современной городской среды, в частности, на объект «Капитальный ремонт (с целью благоустройства) площади «Крымской весны» и прилегающей территории в городе Щёлкино в размере 30 389,59 тыс. рублей.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым (далее – МинЖКХ Крыма) и Администрацией г. Щёлкино заключено соглашение от 05.03.2025 № 27 (с учетом 6 дополнительных соглашений к нему) (далее – Соглашение, Соглашение № 27 соответственно), согласно которому в 2025 году общий объем ассигнований в бюджете городского поселения Щёлкино на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях которых предоставляется субсидия на объект «Капитальный ремонт (с целью благоустройства) площади «Крымской весны» и прилегающей территории в г. Щёлкино, составил 30 389,59 тыс. рублей (в том числе средства бюджета Республики Крым – 30 359,21 тыс. рублей (99,9 %)).

В 2025 году кассовый расход средств субсидии составил в общей сумме 30 149,59 тыс. рублей (в том числе средства бюджета Республики Крым – 30 119,45 тыс. рублей). Результат использования субсидии на 2025 год достигнут.

В нарушение Соглашения № 27 Администрация г. Щёлкино несвоевременно направила уведомление МинЖКХ Крыма об уменьшении доведенных лимитов бюджетных обязательств по субсидии на сумму 239,76 тыс. рублей (в течение 44 рабочих дней, вместо 5 рабочих дней).

Дополнительным соглашением от 26.12.2025 № 7 к Соглашению № 27 размер субсидии по объекту «Капитальный ремонт (с целью благоустройства) площади «Крымской весны» и прилегающей территории в г. Щёлкино уменьшен до 30 119,45 тыс. рублей.

На основании ч. 67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), Распоряжения Главы Республики Крым от 28.01.2025 № 103-рг «Об определении единственного подрядчика» (в редакции распоряжения Главы Республики Крым от 14.02.2025 № 268-рг) Администрацией г. Щёлкино (Заказчик) и ООО «ИнженерСервис» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт от 14.02.2025 № 4/2025 (далее – Контракт № 4/2025) (положительное заключение ГАУ РК «Госстройэкспертиза» от 17.02.2023 № 91-1-1-2-007646-2023), согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить работы по благоустройству территорий на объекте: «Капитальный ремонт (с целью благоустройства) площади «Крымской весны» и прилегающей территории в г. Щёлкино. С учетом четырех дополнительных соглашений к Контракту № 4/2025 цена контракта составила

30 149,59 тыс. рублей; срок завершения работ на объекте – до 01.07.2025; срок действия контракта – до 01.08.2025.

ООО «ИнженерСервис» выполнены работы по благоустройству территорий на объекте на общую сумму 30 149,59 тыс. рублей, которые оплачены в полном объеме, задолженность отсутствует.

Администрацией г. Щёлкино допущены нарушения требований действующего законодательства в сфере закупок, в части:

- несоблюдения срока оплаты выполненных работ ООО «ИнженерСервис» от 1 до 8 дней;

- осуществления оформления документа о приемке выполненной работы без предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств;

- ненаправления требования об уплате штрафа за неисполнение Подрядчиком обязательства по предоставлению обеспечения гарантийных обязательств.

В ходе контрольного мероприятия нарушения устранены: Администрацией г. Щёлкино требование об уплате штрафных санкций направлено в адрес ООО «ИнженерСервис» на сумму 5,00 тыс. рублей, которое оплачено в полном объеме; ООО «ИнженерСервис» предоставлено обеспечение гарантийных обязательств по Контракту № 4/2025 путем перечисления денежных средств Администрации г. Щёлкино в сумме 167,50 тыс. рублей (платежное поручение от 09.12.2025 № 206).

На основании Решения комиссии Администрации г. Щёлкино по поступлению и выбытию активов и материальных ценностей от 01.07.2025 № 2 об оценке стоимости имущества, отчуждаемого не в пользу организаций бюджетной сферы (ф. 0410442), расходы по Контракту № 4/2025 в сумме 30 149,59 тыс. рублей отнесены на увеличение стоимости существующего муниципального имущества – «площадь «Крымской весны», чем нарушена Учетная политика Администрации г. Щёлкино в части объединения объектов благоустройства, которые имеют разные функциональные назначения, сроки полезного использования, стоимость, в единый инвентарный объект.

В ходе контрольного мероприятия по состоянию на 09.12.2025 проведен осмотр объекта: «Капитальный ремонт (с целью благоустройства) площади «Крымской весны» и прилегающей территории в г. Щёлкино» и установлено, что в рамках капремонта созданы объекты благоустройства: скамейки, урны, освещение, система видеонаблюдения, система автополива, оборудование детской площадки, оборудование площадок для отдыха и досуга, малые архитектурные формы. Нарушения (замечания) не установлены. Факты нецелевого использования средств субсидии не установлены.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 23.01.2026 № 1-1/26 и направлен в адрес Государственного Совета Республики Крым, Главы Республики Крым, Совета министров Республики Крым, прокуратуру Республики Крым.

Для принятия мер реагирования, устранения нарушений и недостатков, установленных по результатам контрольного мероприятия, внесено представление Счетной палаты Республики Крым в адрес Администрации г. Щёлкино.

В превентивных целях, а также для учета в работе направлено информационное письмо по результатам контрольного мероприятия в адрес Администрации г. Щёлкино.

Контрольное мероприятие

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2025 году на выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Капитальный ремонт (с целью благоустройства) площади «Крымской весны» и прилегающей территории в городе Щёлкино Ленинского района Республики Крым» в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни»





Цели и объекты мероприятия



- оценить результаты использования муниципального образованием Республики Крым межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Республики Крым на выполнение работ по благоустройству территорий на объекте.



- Администрация города Щёлкино Ленинского района.





Результаты контрольного мероприятия

Утверждены Правила благоустройства территории МО ГП Щёлкино Ленинского района Республики Крым
(решение Щёлкинского городского совета от 25.08.2022 № 3, от 26.09.2025 № 2).



Объект включен в Адресный перечень общественных территорий:

- подлежащих благоустройству, источником финансового обеспечения являются средства бюджета г. Москвы, в рамках реализации **Госпрограммы «Реформирование ЖКХ Республики Крым»** на 2025 год.

- **муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО ГП Щёлкино Ленинского района Республики Крым».**

По общественной территории площадь «Крымской весны» и прилегающей территории в г. Щёлкино **инвентаризация не проводилась, паспорт благоустройства общественной территории не составлялся.**



Объем финансового обеспечения объекта



30,39
млн
рублей

- Объем ассигнований в 2025 году в бюджете городского поселения Щёлкино на финансовое обеспечение расходных обязательств (в т. ч. средства бюджета Республики Крым – 30,36 млн рублей (99,9 %) согласно заключенному соглашению МинЖКХ Крыма с Администрацией г. Щёлкино от 05.03.2025 № 27.

30,15
млн
рублей

- Кассовый расход средств субсидии в 2025 году. Результат достигнут.

44
рабочих
дня

- Администрация г. Щёлкино несвоевременно направила уведомление МинЖКХ Крыма об уменьшении доведенных лимитов бюджетных обязательств по субсидии на сумму 0,24 млн рублей в нарушение Соглашения № 27 (в течение 44 рабочих дней, вместо 5 рабочих дней).

30,12
млн
рублей

- размер субсидии за счет средств бюджета Республики Крым по объекту уменьшен дополнительным соглашением от 26.12.2025 № 7 к Соглашению № 27.



Результаты контрольного мероприятия

Администрация г. Щелкино (Заказчик), ООО «ИнженерСервис» (Подрядчик).



Срок завершения работ на объекте – до 01.07.2025,
Срок действия контракта – до 01.08.2025.



Нарушения Администрацией г. Щёлкино Федерального закона № 44-ФЗ, Контракта № 4/2025 в части:

- несоблюдения сроков оплаты выполненных работ ООО «ИнженерСервис» от 1 до 8 дней;
- оформления документов о приемке выполненной работы без предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств;
- не направления требования об уплате штрафа за неисполнение Подрядчиком обязательств по предоставлению обеспечения гарантийных обязательств.



В ходе проверки нарушения устранены. Перечислены Подрядчиком 167,50 тыс. рублей (обеспечение гарантийных обязательств) Администрации г. Щёлкино, оплачен штраф в размере 5,00 тыс. рублей.




Результаты контрольного мероприятия по бухгалтерскому учету Администрации г. Щёлкино



30,15
млн рублей

Расходы по Контракту № 4/2025 сформированы на счете бухгалтерского учета 108.00 «Нефинансовые активы имущества казны».

Решением комиссии Администрации г. Щёлкино по поступлению и выбытию активов и материальных ценностей от 01.07.2025 № 2 отнесены на увеличение стоимости существующего муниципального имущества – «площадь «Крымской весны»



Нарушены требования раздела 4 «Учет основных средств» Учетной политики Администрации г. Щёлкино в части объединения объектов благоустройства, которые имеют разные функциональные назначения, сроки полезного использования, стоимость, в единый инвентарный объект.









Проведенный осмотр объекта

«Капитальный ремонт (с целью благоустройства) площади «Крымской весны»

Нарушения (замечания) не установлены. Факты нецелевого использования средств субсидии не установлены.

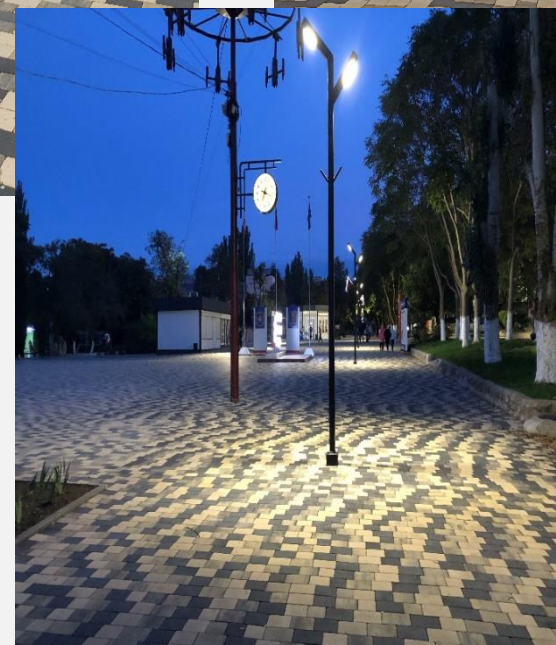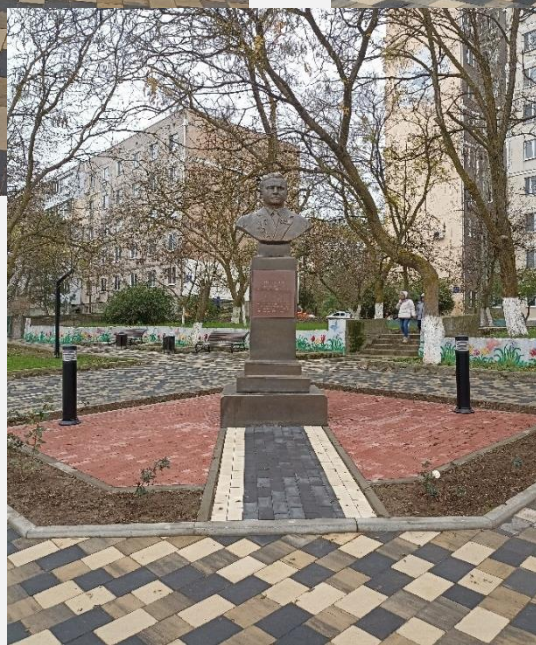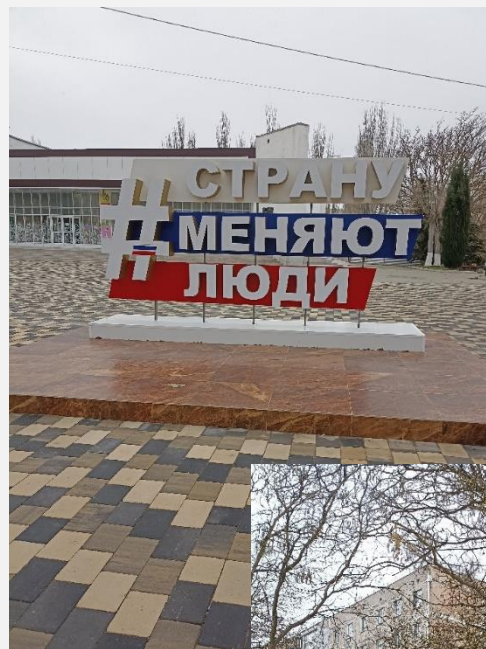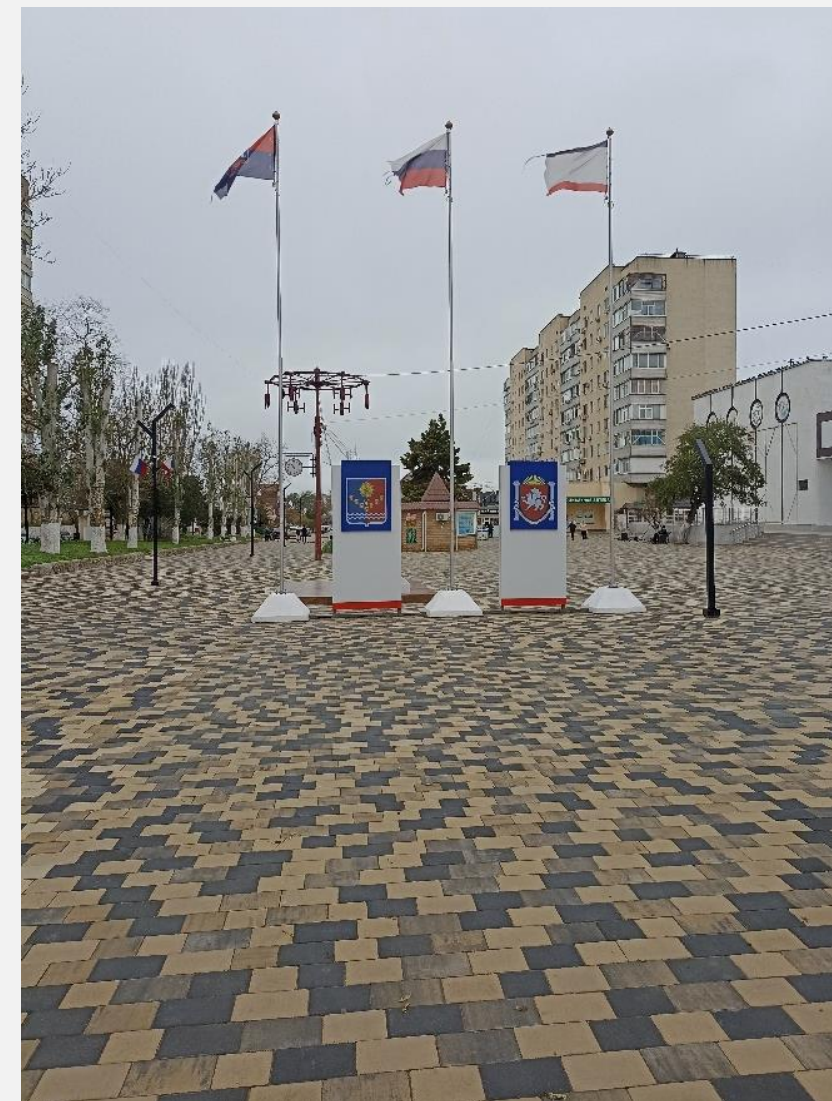



Рекомендации по итогам контрольного мероприятия Администрации г. Щёлкино

1

С целью:

- определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, а также выявления территорий, требующих благоустройства, в г. Щёлкино, проводить инвентаризацию общественных территорий с составлением соответствующих документов согласно Порядку инвентаризации территорий.

2

- недопущения нарушения соглашений в части несвоевременного информирования об отсутствии потребности в соответствующих субсидиях, усилить контроль за их выполнением.

3

Неукоснительно соблюдать требования Федерального закона № 44-ФЗ в части своевременного исполнения обязательств (оплаты), предусмотренных контрактом, оформления документов о приемке выполненной работы при предоставлении обеспечения гарантийных обязательств подрядчиком (исполнителем); направления поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в т. ч. гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

4

Отразить в соответствии с требованиями раздела 4 «Учет основных средств» Учетной политики Администрации г. Щёлкино созданные нефинансовые активы в рамках исполнения Контракта № 4/2025.
