

**«Анализ выполнения показателей региональных проектов Республики Крым,  
направленных на достижение целей национальных проектов за 2019-2024 годы»**



Анализ сформированных в Республике Крым нормативных-правовых актов и методических документов, регламентирующих порядок подготовки, реализации, мониторинга и контроля за реализацией региональных проектов, оценка изменений нормативной базы, регулирующей подготовку и реализацию региональных проектов

**Единые методические рекомендации  
по проектной деятельности  
(Письмо Аппарата Правительства  
Российской Федерации от 01.07.2022  
№ П6-53625)**

**Постановление Правительства  
Российской Федерации  
от 31.10.2018 № 1288  
«Об организации проектной  
деятельности в Правительстве  
Российской Федерации»**

**Постановление Совета  
министров Республики  
Крым от 22.01.2021 № 26  
«Об организации  
проектной деятельности в  
Республике Крым»**

**Проектный комитет  
Республики Крым**

**Региональный  
проектный офис**

**Ведомственные  
координационные  
органы**

# Анализ эффективности системы мониторинга и контроля реализации региональных проектов


 **Согласование выполнения исполнительными органами Республики Крым функций по реализации региональных проектов**

 **Контроль своевременности представления и оценки достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, мероприятий (результатов)**

 **Согласование планов, программ и проектов, реализуемых на территории Республики Крым, с региональными проектами**

 **Координация процессов и процедур управления рисками реализации региональных проектов**

**Региональный проектный офис**

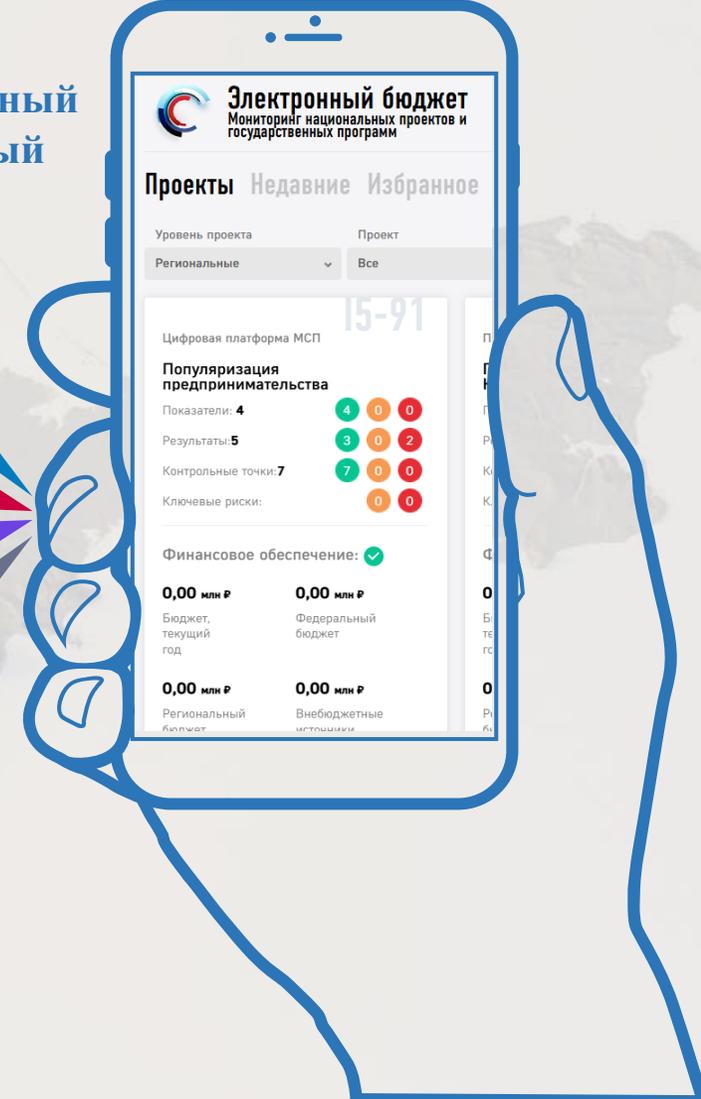


# Определение и оценка социально-экономических эффектов от реализации национального проекта «Здравоохранение»



## МОДЕРНИЗИРОВАНО, ПОСТРОЕНО:

- 137 объектов (в том числе: ФАПы, поликлиники, больницы и амбулаторные учреждения)
- 2 психоневрологических интерната



## ПОСТАВЛЕНО:

- 1380 ед. медицинского оборудования, в том числе оснащены
- 2 региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями
- 7 региональных и сосудистых центров



## УВЕЛИЧЕНА ЧИСЛЕННОСТЬ:

- До 7 743 врачей
- До 17 935 средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях



## ПРИБРЕТЕНО:

- 145 автомобилей
- 10 передвижных медицинских комплексов

Комплексные меры в сфере здравоохранения позволили достигнуть увеличения продолжительности жизни в 2023 году до рекордного показателя – 72,76 года

**53,0%** Населения удовлетворены медицинской помощью

**9,53%** Снижена больничная летальность .

**19,8%** Снижена одногодичная летальность от инфаркта миокарда

**100%** Лицам старшего трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологии находятся под диспансерным наблюдением



# Определение и оценка социально-экономических эффектов от реализации национального проекта «Образование»



## СОЗДАНО

- 4 общеобразовательных учреждения с общим количеством мест 2220
- 78 221 новое место в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах



## ФУНКЦИОНИРУЮТ

- 220 центров образования «Точка роста»
- 5 детских технопарков «Кванториум»
- 2 центра «IT-куб»



## В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

- 36 учителей, переехавших на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки получили выплаты по 1 млн рублей



## ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

- до 186 087 человек увеличена численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность



## ОБНОВЛЕНА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА:

- 8 организациям, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
- 82 общеобразовательным организациям, для занятия детей спортом
- 388 общеобразовательным организациям, для внедрения цифровой образовательной среды

86,1%

Охвачено детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием

100,4%


Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

100,0%

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды



# Определение и оценка социально-экономических эффектов от реализации национального проекта «Демография»



## МОДЕРНИЗИРОВАНО, ПОСТРОЕНО

- 219 спортивных площадок
- МБУ «Дворец спорта» г. Евпатория
- Учебно-тренировочный центр «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Авангард»
- ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное училище (техникум) олимпийского резерва»
- капитальный ремонт 3 территориальных отделений центров занятости населения.



## ПРИОБРЕТЕНО СПОРТОБОРУДОВАНИЕ:

- 12 спортивных школ
- 18 комплексов спортивного оборудования (малые спортивные формы)
- 10 школ олимпийского резерва



## ПОСТРОЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- 7 детских садов (созданы 2 035 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет)
- 2 физкультурно-оздоровительных комплекса в городах Саки и Судак
- 2 психоневрологических интерната



56,7%

Жителей Республики Крым систематически занимаются физкультурой и спортом

51,0%

Обеспеченность граждан спортивными сооружениями

100 %

Лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением

100 %

Доступность дошкольного образования



# Определение и оценка социально-экономических эффектов от реализации национального проекта «Культура»



## ОСНОВНЫМИ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

- 2 кинозала
- 9 муниципальных музеев
- 3 региональных и муниципальных театра
- 12 муниципальных библиотек переоснащены по модельному стандарту
- 27 детских школ искусств оснащены музыкальными инструментами
- 6 виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры
- создано 9 мультимедиа гидов



## ЗАКУПЛЕНО:

- 10 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов)



- 4 787 человек приняли участие в программе «Волонтеры культуры»
- 2 520 специалистов повысили свою квалификацию
- 60 лучшим учреждениям культуры оказана государственная поддержка
- 66 лучшим работникам сельских учреждений культуры оказана государственная поддержка



## РЕКОНСТРУИРОВАНЫ ИЛИ КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАНЫ

- 20 домов культуры, в том числе и в сельской местности
- 7 детских школ искусств
- 5 муниципальных музеев
- 1 муниципальный театр юного зрителя



# Определение и оценка социально-экономических эффектов от реализации национального проекта «Жилье и городская среда»



ОБЕСПЕЧЕН ВВОД ЖИЛЬЯ:

1,23 млн м<sup>2</sup>



СОКРАЩЕН ФОНД АВАРИЙНОГО  
ЖИЛЬЯ:

27,537 тыс. м<sup>2</sup>



РЕАЛИЗОВАНО:

441

мероприятие по благоустройству  
мест массового отдыха населения



63%

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов

30,3%

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды

100%

Доля закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования



# Определение и оценка социально-экономических эффектов от реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»



## БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального, межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на территории Республики Крым (18% от всей сети автомобильных дорог)



85,5%

Увеличена доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии

35,5%

Снижение количества погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств

75,1%

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям



## УСТАНОВЛЕНО:

- 360 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах
- 1 автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств





## ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА

- обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей (18 пляжей на морских побережьях и пресных водоемах)
- поддержка доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов



## ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

- созданы модульные некапитальные средства размещения (11 кемпингов и автокемпингов)
- обеспечена поддержка и продвижение 10 357 событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов
- осуществлено комплексное обустройство туристского центра Евпатории, Алупки и Феодосии



## ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

100%

социально значимых объектов, имеют доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

40%

доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн)




# Определение и оценка социально-экономических эффектов от реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»



Увеличилось с **231,2** тыс. до **358,2** тыс. человек занятых в сфере малого и среднего предпринимательства



**9 618** человек вовлечены в предпринимательскую деятельность



## СУБЪЕКТАМ МСП В АПК

- 255 получили информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
- 42 сельскохозяйственных товаропроизводителя получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК
- 60 субъектами реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализацию сельскохозяйственной продукции

## САМОЗАНЯТЫМ ГРАЖДАНАМ

- Обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включённых в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного МСП
- 1 227 самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн и онлайн форматах
- 20 578 индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения, улучшены условия ведения предпринимательской деятельности



- 1 575 субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций
- 4 817,87 млн. рублей предоставлены в качестве поручительств (гарантии) гарантийными организациями

# Определение и оценка социально-экономических эффектов от реализации национального проекта «Экология»



**ВВЕДЕНЫ В ПРОМЫШЛЕННУЮ  
ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

**0,117** мощности по обработке (сортировке)  
млн тонн твердых коммунальных отходов

- ликвидированы 2 несанкционированные свалки в границах городов Судак и Белогорск
- более 15 га земель возвращено в народное хозяйство Республики Крым



**УЛУЧШЕНО ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕК**

**20** км расчищены участки русел рек Салгир с притоками, Славянка, Отуз и ручей Кизилташский



- восстановлено 200 га вырубленных и погибших лесных насаждений
- сформирован запас 90 кг лесных семян для лесовосстановления
- 87 единиц лесопожарной техники закуплено для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров




**32,7**  
тыс. человек

**Улучшены экологические условия проживания**



# Анализ наличия не использованного финансирования предыдущих периодов. Причины, последствия недофинансирования мероприятий. Выявление фактов переноса финансирования на иные мероприятия

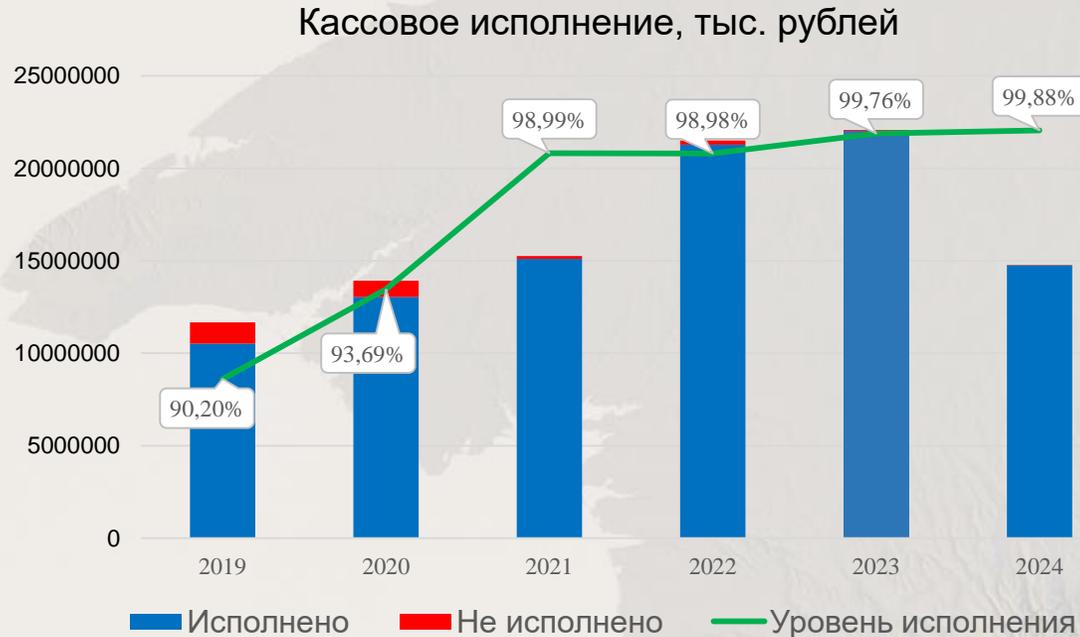

## Основные причины корректировок сроков и объема финансового обеспечения:

- ❖ невыполнение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов;
- ❖ низкое качество проектно-сметной документации;
- ❖ несвоевременное или некачественное осуществление закупочной деятельности;
- ❖ особенности реализации региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики.

# Оценка обоснованности создания (приобретения) имущества в рамках регионального проекта, его стоимости, объемов и источников финансового обеспечения, его последующей эксплуатации и содержания

Наименование национального/регионального проекта	Выявленные в 2019-2024 годах недостатки
«Формирование комфортной городской среды»	факты длительного простоя оборудования и объектов по причине отсутствия надлежащего организационного и финансового обеспечения полученных результатов. Длительные сроки передачи создаваемых объектов соответствующим эксплуатирующим организациям.
«Туризм и индустрия гостеприимства»	при получении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями туристской индустрии субсидий на создание модульных средств, создание пляжей и развитие инфраструктуры их получатели не были ограничены обязательствами по дальнейшей долгосрочной реализации проектов, сохранности и использовании приобретенного оборудования.
«Образование»	отмечено отсутствие оборудования, необходимого для реализации образовательных программ, организации питания и медицинского обслуживания на вновь созданных объектах. Средства не были предусмотрены в Плане финансово-хозяйственной деятельности учреждений.
«Демография»	отмечено низкое качество подготовки проектно-сметной документации по всем исследуемым объектам, что повлекло за собой необходимость корректировки в ходе исполнения контракта. Качество и комплектация вводимых в эксплуатацию детских садов на территории Республики Крым находилась на низком уровне (по 8 из 10 проверенных учреждений), что привело к дополнительным затратам средств, лишило возможности своевременного получения лицензии на осуществление образовательной деятельности и дальнейшему простоя объектов.
«Спорт – норма жизни»	факты длительного простоя оборудования и объектов по причине отсутствия надлежащего организационного и финансового обеспечения полученных результатов. Факты приемки заказчиками не предусмотренных сметной документацией работ, завышения стоимости работ.
«Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	факты длительного неиспользования по назначению медицинских изделий и оборудования.

# Оценка фактического достижения запланированных показателей и результатов регионального проекта, включая анализ причин выявления отклонений

Обеспеченность граждан спортивными сооружениями

Не достигнут результат «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами» регионального проекта «Чистая вода»

Согласно информации Роспотребнадзора все население городов Евпатория, Красноперекоск, Саки, Джанкой, Армянск, Красноперекоского, Раздольненского и Черноморского районов обеспечено некачественной питьевой водой, которая не соответствует гигиеническим нормативам по показателям общей жесткости, общей минерализации, хлоридам, нитратам, сульфатам



Показатель «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» регионального проекта «Жилье» достигнут путем сокращения его значения

**СПОРТ →  
НОРМА  
ЖИЗНИ**

Сокращение результатов в связи с невыполнением социально значимых объектов



## Выявление фактов занижения/завышения плановых и фактических значений показателей, обоснованность корректировки

Показатели за 2019-2024 годы

■ Исключены ■ Достигнуты ■ Не достигнуты




- ❖ **«Спорт – норма жизни»** значение показателя «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %» было сокращено на – 11,10 процентных пункта;
- ❖ **«Жилье»** значение показателя «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, (млн кв. метров)» сокращено в 5 раз;
- ❖ **«Чистая вода»** значение показателя «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, штук» сокращено до 0;
- ❖ **«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** значение показателя «Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате отдельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» сокращено на 2,4 процентных пункта.

# Оценка эффективности расходования средств бюджета, направленных на реализацию региональных проектов

**Значительные суммы неэффективно использованных средств выявлены при реализации проектов в сфере здравоохранения, спорта, экологии и дорожного строительства**

Неиспользование результатов в  
течении длительного периода



Применение избыточных  
технологических решений

Завышение средней рыночной  
стоимости работ и материалов



Демонтаж работ и оборудования,  
непригодных к эксплуатации



Неэффективное ведение  
претензионной работы

## Предложения Совету министров Республики Крым по результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия

- ✓ рассмотреть возможность приоритетного использования типовой проектной документации
- ✓ взять на особый контроль проведение претензионной и исковой работы
- ✓ усилить контроль над использованием бюджетных средств при реализации в 2025-2030 годах проектов в сфере здравоохранения, спорта, экологии и дорожного строительства, а также обеспечить применение результатов завершенных мероприятий
- ✓ рассмотреть возможность обеспечения системной работы при планировании мероприятий и реализации региональных проектов органов местного самоуправления, иных органов и организаций, являющихся участниками, исполнителями или соисполнителями регионального проекта
